
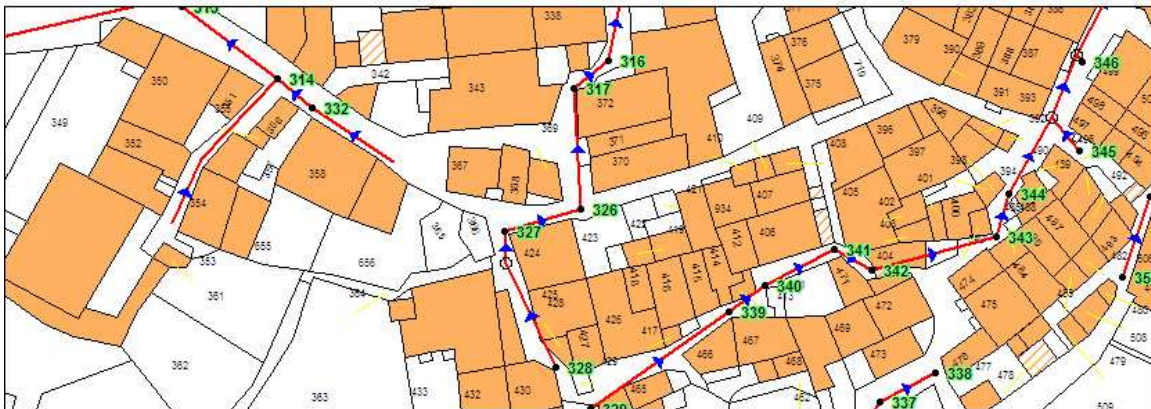


<b>Désignation</b>	Ouvrage visité	<b>Type d'ouvrage</b>	Regard de visite simple
<b>Altimétrie</b>	Cote tampon NGF : NR m	Profondeur : 0,680 m	Cote radier NGF : NR m
<b>Debit eau claire parasite (QECF)</b>	NR l/s		

Photo intérieure	caractéristiques des canalisations					
	Collecteur	Angle	Géométrie	Nature	FE/TN	FE/NGF
	1:Arrivée I	106 °	Ø150	Fibro ciment	0,680 m	NR m
	2:Arrivée II.1	257 °	Ø50	PVC	0,460 m	NR m
	3:Arrivée II.2	280 °	Ø100	PVC	0,300 m	NR m
	4:Arrivée II.3	236 °	Ø150	Fibro ciment	0,680 m	NR m
	8:Exutoire I	360 °	Ø150	Fibro ciment	0,680 m	NR m

Localisation


Observations sur les collecteurs	
1	
2	Arrivée en chute
3	Arrivée en chute
4	
8	

Observations sur la cunette	
Obstacle dépôts	Abrasion/corrosion
Absence de cunette	

Observations sur le regard
----------------------------

Travaux proposés	
Hydrocurage	Amélioration de l'écoulement
