


| | | | |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Désignation | Ouvrage visité | Type d'ouvrage | Regard de visite simple |
| Altimétrie | Cote tampon NGF : NR m | Profondeur : 0,900 m | Cote radier NGF : NR m |
| Debit eau claire parasite (QECP) | NR l/s | | |

| Photo intérieure | caractéristiques des canalisations | | | | | |
|------------------|------------------------------------|-------|-----------|--------------|---------|--------|
| | Collecteur | Angle | Géométrie | Nature | FE/TN | FE/NGF |
| | 1:Arrivée I | 170 ° | Ø250 | Fibro ciment | 0,900 m | NR m |
| | 2:Arrivée II.1 | 16 ° | Ø100 | PVC | 0,600 m | NR m |
| | 3:Arrivée II.2 | 359 ° | Ø150 | PVC | 0,750 m | NR m |
| | 8:Exutoire I | 73 ° | Ø250 | Fibro ciment | 0,900 m | NR m |

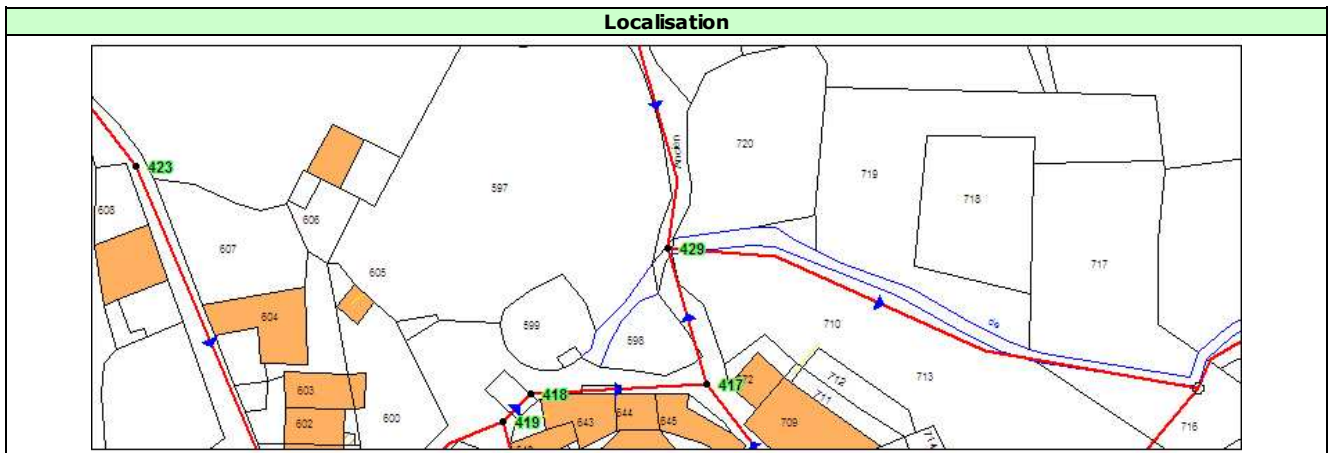

| Observations sur les collecteurs | |
|----------------------------------|------------------|
| 1 | |
| 2 | Arrivée en chute |
| 3 | Arrivée en chute |
| 8 | |

Observations sur la cunette

Observations sur le regard

Travaux proposés
