

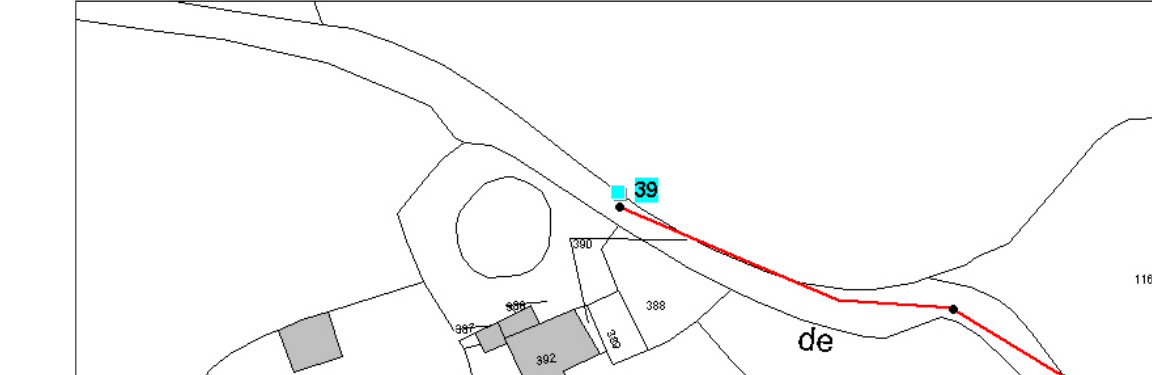
 <p>GINGER ENVIRONNEMENT & INFRASTRUCTURES Les Hauts de la Duranne - 370 rue R. Descartes - CS 90340 13799 Aix-en- Provence Cedex 3 04 42 99 27 27</p>		<h2>RÉSULTATS DES TESTS À LA FUMÉE</h2> <h3>CCBVIR - COMMUNE DE MONTICELLO</h3>	<h2 style="color: red;">AF</h2> <h2 style="color: red;">N° 00039</h2> <p>(HY13 B001)</p>
--	---	---	--

PHOTO	DESCRIPTION		
	<table border="1"> <tr> <td>CAMPAGNE</td><td>fumee equipe 2</td></tr> </table>	CAMPAGNE	fumee equipe 2
	CAMPAGNE	fumee equipe 2	
	<table border="1"> <tr> <td>TYPE D'ANOMALIE</td><td>Boîte de branchement défectueuse</td></tr> </table>	TYPE D'ANOMALIE	Boîte de branchement défectueuse
	TYPE D'ANOMALIE	Boîte de branchement défectueuse	
	<table border="1"> <tr> <td>DOMAINE_APPLICATION</td><td>Privé</td></tr> </table>	DOMAINE_APPLICATION	Privé
	DOMAINE_APPLICATION	Privé	
	<table border="1"> <tr> <td>SURFACE RACCORDÉE</td><td>10 m²</td></tr> </table>	SURFACE RACCORDÉE	10 m²
SURFACE RACCORDÉE	10 m²		
<table border="1"> <tr> <td>LOCALISATION</td><td>Adresse propriétaire : Parcelle :</td></tr> </table>	LOCALISATION	Adresse propriétaire : Parcelle :	
LOCALISATION	Adresse propriétaire : Parcelle :		
<table border="1"> <tr> <td>REGARD D'INJECTION</td><td></td></tr> </table>	REGARD D'INJECTION		
REGARD D'INJECTION			
<table border="1"> <tr> <td>PROPOSITION DE TRAVAUX</td></tr> </table>		PROPOSITION DE TRAVAUX	
PROPOSITION DE TRAVAUX			
Remise en conformité de la boite de branchement inversée			
<div style="height: 80px;"></div>			

RÉPONSE À LA FUMÉE	VALIDATION AU COLORANT	
<input checked="" type="checkbox"/> Rapide <input checked="" type="checkbox"/> Nette <input type="checkbox"/> Différée <input type="checkbox"/> Diffuse	<input checked="" type="checkbox"/> Pas de contrôle au colorant pratiqué (élément inaccessible, propriétaire absent, prestation non prévue...)	<input type="checkbox"/> Connection hydraulique avérée par traçage au colorant <input type="checkbox"/> Connection hydraulique invalidée par traçage au colorant

LOCALISATION


COMMENTAIRES
La boite de branchement n'est pas étanche. L'estimation de la surface collectée est a minima.
