

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client : EARL VAL'ARGONNE, 1 bis Grande Rue - 51800 Braux Saint Rémy	
Date : 30/03/2021	n° DRIRE : 2287/2021
Affaire suivie par : Monsieur MARTIN PRIN Damien	
Type de chantier : Forage d'eau pour les besoins d'un poulailler	
Lieu du chantier : Braux Saint Rémy (51)	

POMPAGE PAR PALIERS

Date : 31/03/2021	Niveau départ : - 2,82 m
Heure déb : 10h11	Hauteur du repère : + 1,00 m
Heure fin : 14h08	Refoulement : 150,00 m


Palier 1		
Temps	ND	Débit
3mn	4,032	
4mn	4,050	9,00
6mn	4,082	
8mn	4,112	
10mn	4,139	9,00
15mn	4,197	
20mn	4,249	
30mn	4,339	
40mn	4,421	
50mn	4,466	9,00
60mn	4,480	

Palier 2		
Temps	ND	Débit
3mn	4,909	
4mn	5,040	12,00
6mn	5,299	
8mn	5,448	
10mn	5,558	
15mn	5,721	
20mn	5,835	12,00
30mn	6,014	
40mn	6,154	
50mn	6,262	
60mn	6,360	12,00

Palier 3		
Temps	ND	Débit
3mn	7,348	
4mn	7,533	15,00
6mn	7,775	
8mn	7,916	
10mn	8,015	
15mn	8,205	15,00
20mn	8,348	
30mn	8,554	
40mn	8,726	
50mn	8,875	15,00
60mn	9,000	

Palier 4		
Temps	ND	Débit
3mn	9,917	
4mn	10,107	
6mn	10,379	18,00
8mn	10,571	
10mn	10,711	
15mn	10,962	18,00
20mn	11,139	
30mn	11,395	
40mn	11,571	
50mn	11,730	18,00
60mn	11,800	

Pompage par paliers sur le forage VALARGONNE, le 31/03/2021 à Braux Saint Rémy

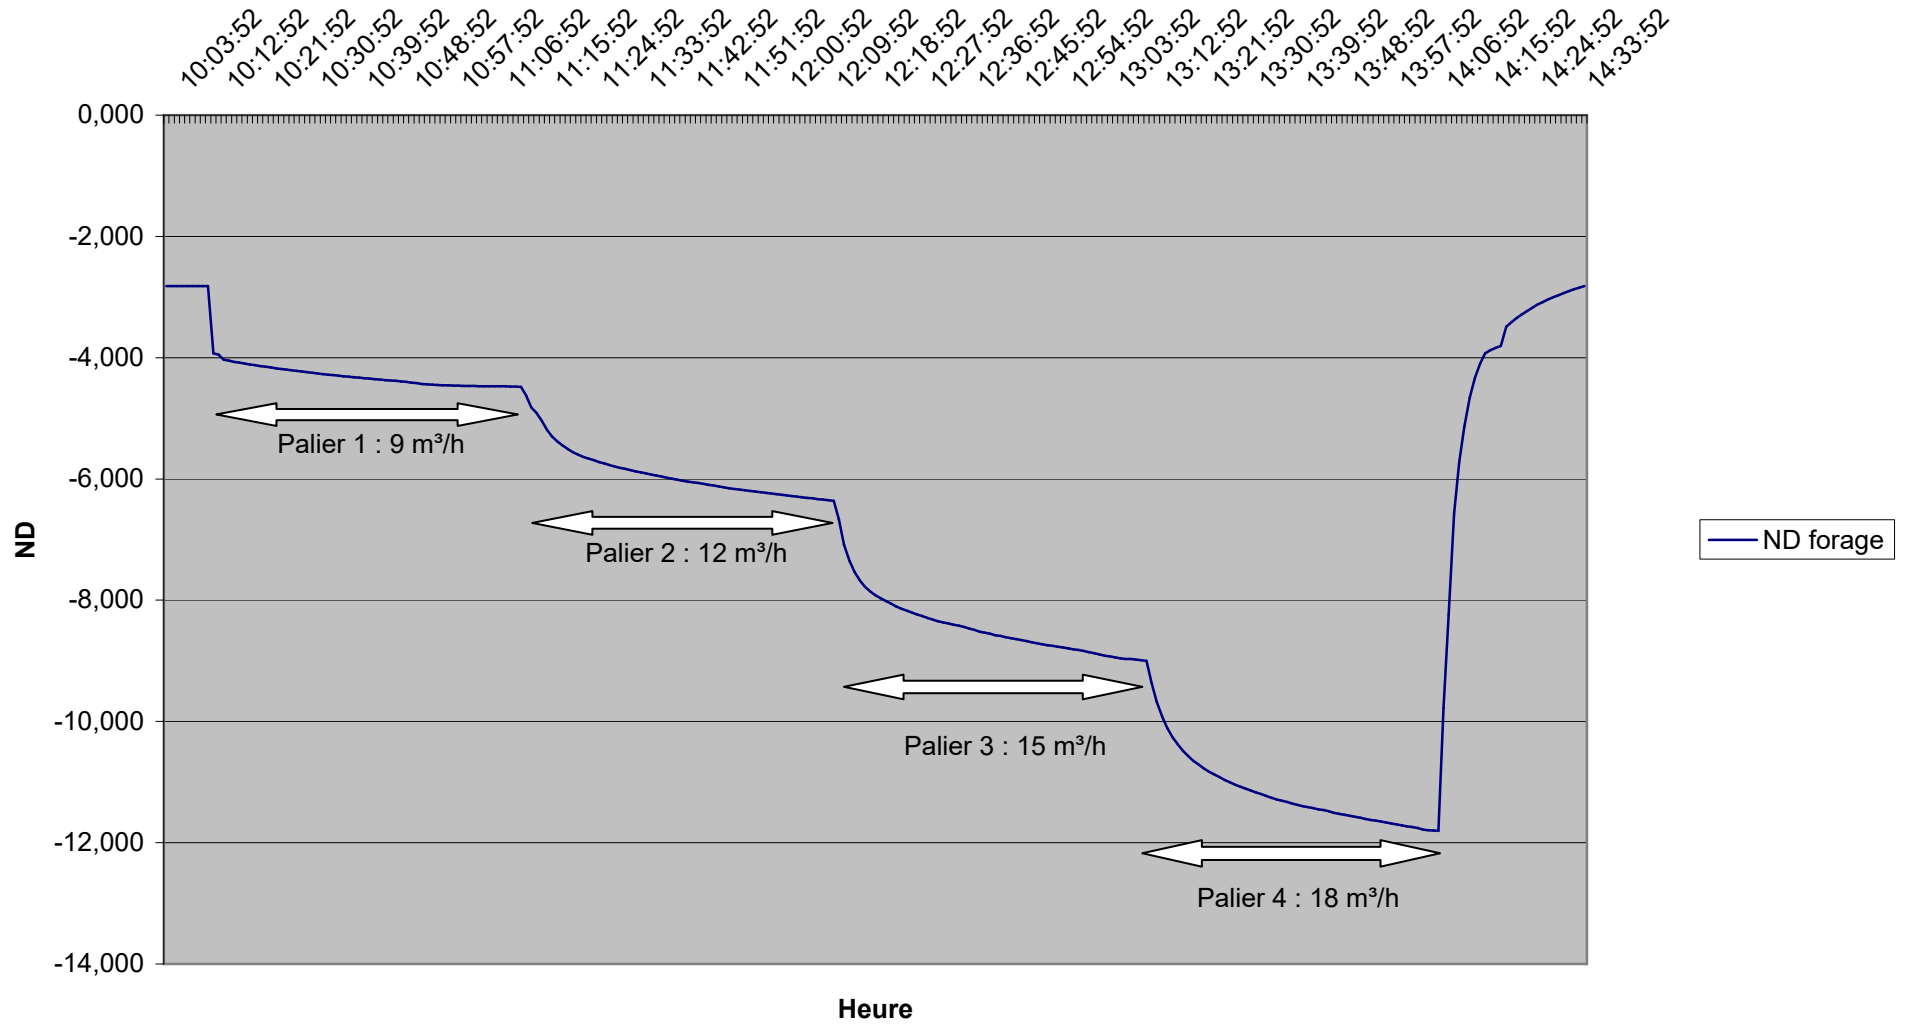

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	EARL VAL'ARGONNE, 1 bis Grande Rue - 51800 Braux Saint Rémy	
Date :	30/03/2021	n° DRIRE : 2287/2021
Affaire suivie par :	Monsieur MARTIN PRIN Damien	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins d'un poulailler	
Lieu du chantier :	Braux Saint Rémy (51)	

POMPAGE DE LONGUE DUREE

Date :	31/03/2021	Niveau départ :	- 2,82 m
Heure déb :	14h35	Hauteur du repère :	+ 1,00 m
Heure fin :	6h51	Refoulement :	150,00 m

Descente				Remontee		
Temps	ND	Debit	Obs	Temps	Forage	Obs
1mn	3,060			1mn	7,870	
1mn30				1mn30		
2mn	3,150			2mn	6,661	
2mn30		14,20		2mn30		
3mn	3,991			3mn	5,951	
3mn30				3mn30		
4mn	4,571			4mn	5,470	
4mn30				4mn30		
5mn	4,969			5mn	5,152	
6mn	5,260			6mn	4,911	
7mn	5,480			7mn	4,721	
8mn	5,647	14,30		8mn	4,565	
9mn	5,781			9mn	4,435	
10mn	5,887			10mn	4,320	
12mn	6,050			12mn	4,137	
14mn	6,174			14mn	3,988	
16mn	6,274			16mn	3,848	
18mn	6,362			18mn	3,757	
20mn	6,430	14,30		20mn	3,693	
25mn	6,575			25mn	3,557	
30mn	6,686			30mn	3,246	
45mn	6,899			45mn	2,920	
1h	7,075	14,30		1h		
1h30	7,281			1h30		
2h	7,467			2h		
3h	7,747			3h		
4h	8,026			4h		
5h	8,268			5h		
6h	8,472			6h		
7h	8,669			7h		
8h	8,888			8h		
9h	9,024			9h		
10h	9,209			10h		
12h	9,413			12h		
14h	9,633			14h		
16h30	9,888	14,30		16h		

**Pompage de 16h à 14,30 m³/h sur le forage VALARGONNE
à Braux Saint Rémy, du 31/03 au 01/04/2021**

