Confortement du système d'endiguement du Piézan

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Hors Intempéries

SOCCO
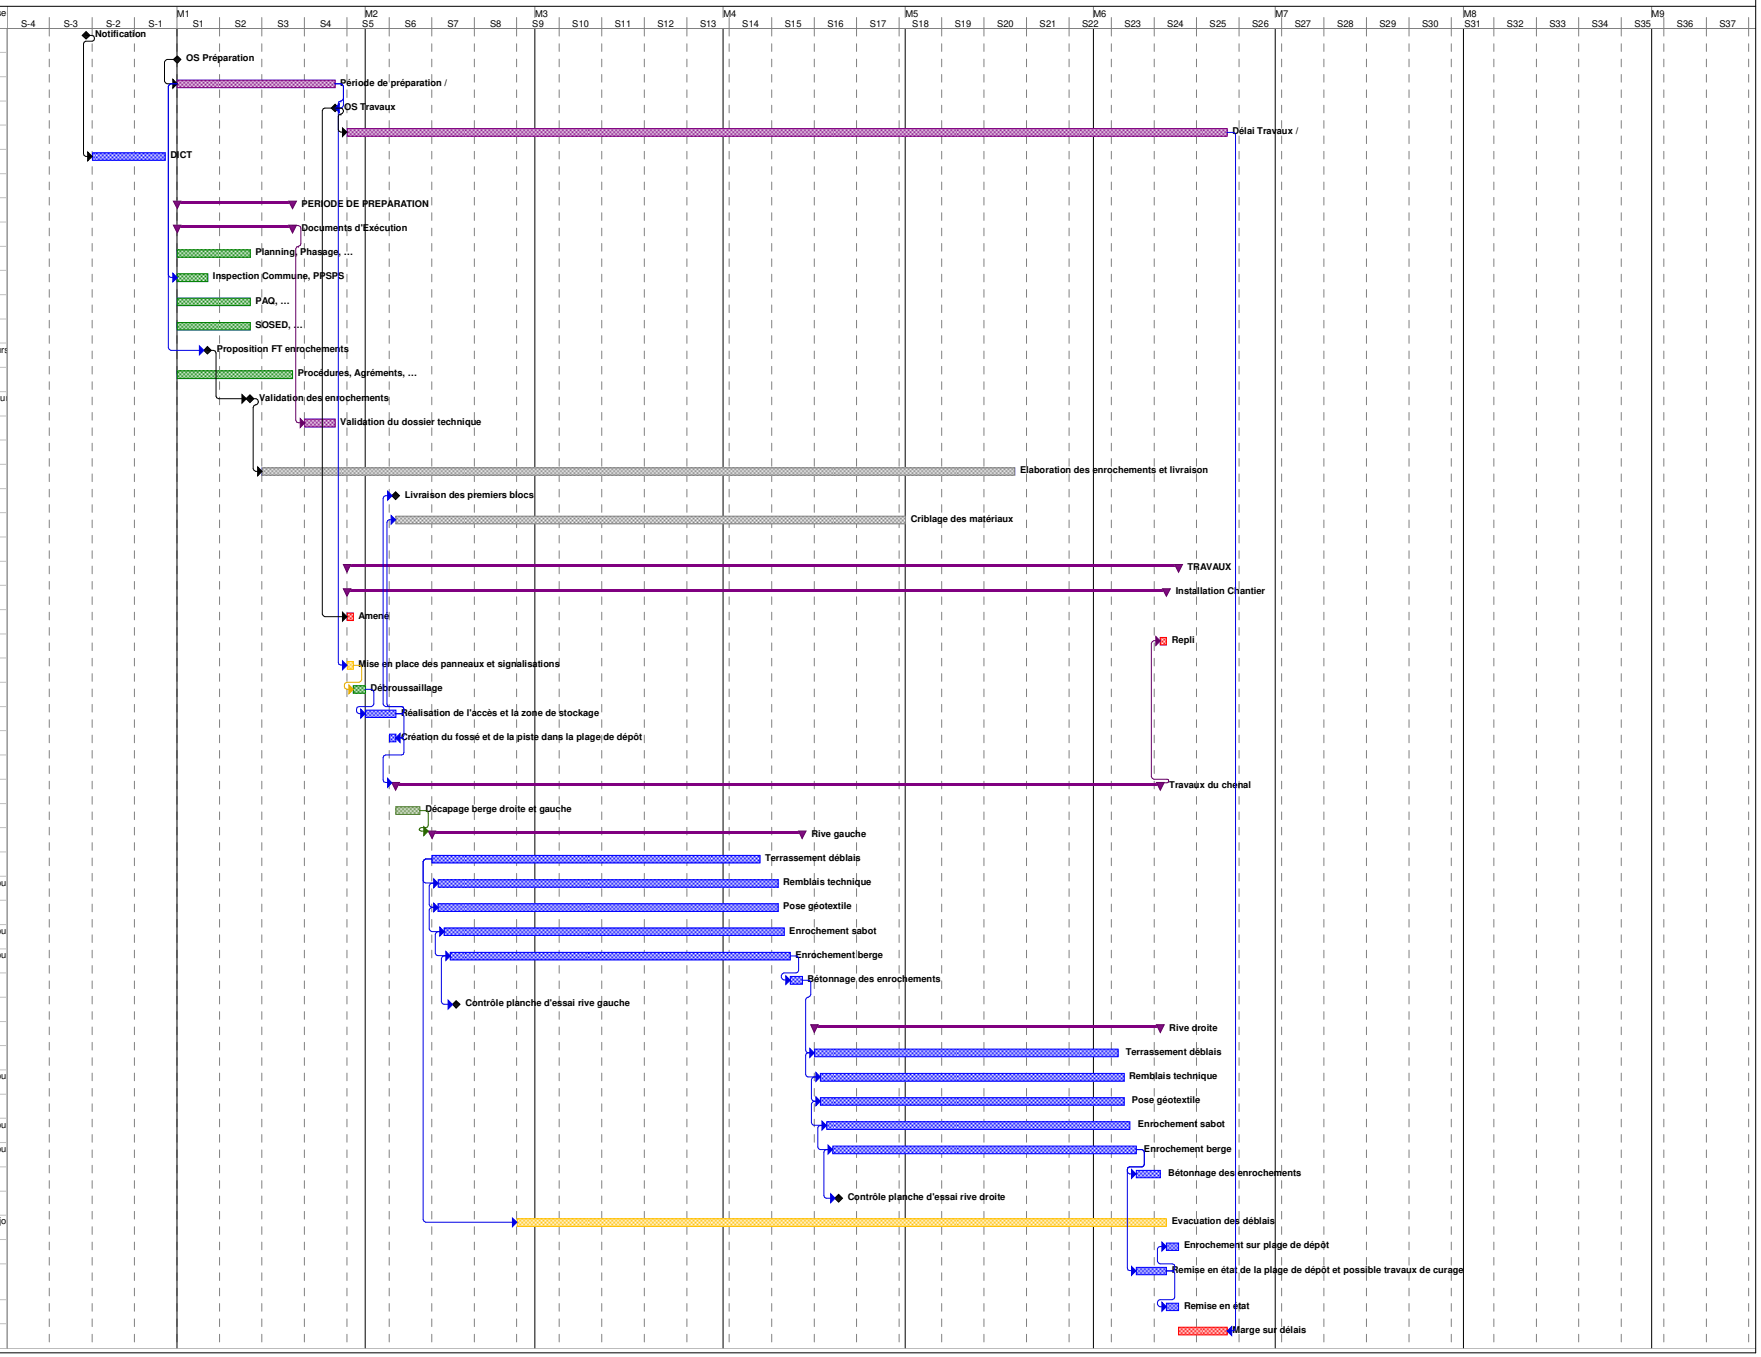
N°	Nom de la tâche	Durée	Prédécesse
1	Notification	0 jour	
2	OS Préparation	0 jour	
3	Période de préparation /	4 sm	2DD
4	OS Travaux	0 jour	3FF
5	Délai Travaux /	21 sm	4
6	DICT	10 jours	1
7			
8	**PERIODE DE PREPARATION**	**15 jours**	
9	**Documents d'Exécution**	**15 jours**	
10	Planning, Phasage, ...	10 jours	
11	Inspection Commune, PPSPS	5 jours	3DD
12	PAQ, ...	10 jours	
13	SOSED, ...	10 jours	
14	Proposition FT enrochements	0 jour	3DD+5 jours
15	Procédures, Agréments, ...	15 jours	
16	Validation des enrochements	0 jour	14FD+5 jou
17	Validation du dossier technique	5 jours	9
18			
19	Elaboration des enrochements et livraison	90 jours	16
20	Livraison des premiers blocs	0 jour	29
21	Criblage des matériaux	60 jours	29
22			
23	**TRAVAUX**	**99 jours**	
24	**Installation Chantier**	**97 jours**	
25	Amené	1 jour	4DD
26	Repli	1 jour	32
27	Mise en place des panneaux et signalisations	1 jour	3
28	Débroussaillage	2 jours	27
29	Réalisation de l'accès et la zone de stockage	3 jours	28
30	Création du fossé et de la piste dans la plage de dépôt	1 jour	29FF
31			
32	**Travaux du chenal**	**90 jours**	**30**
33	Décapage berge droite et gauche	4 jours	
34	**Rive gauche**	**45 jours**	**33**
35	Terrassement déblais	40 jours	
36	Remblais technique	40 jours	35DD+1 jou
37	Pose géotextile	40 jours	36DD
38	Enrochement sabot	40 jours	37DD+1 jou
39	Enrochement berge	40 jours	38DD+1 jou
40	Bétonnage des enrochements	2 jours	39
41	Contrôle planche d'essai rive gauche	0 jour	39DD+1 jour
42	**Rive droite**	**41 jours**	
43	Terrassement déblais	36 jours	40
44	Remblais technique	36 jours	43DD+1 jou
45	Pose géotextile	36 jours	44DD
46	Enrochement sabot	36 jours	45DD+1 jou
47	Enrochement berge	36 jours	46DD+1 jou
48	Bétonnage des enrochements	2 jours	47
49	Contrôle planche d'essai rive droite	0 jour	47DD+1 jour
50	Evacuation des déblais	77 jours	35DD+10 jo
51	Enrochement sur plage de dépôt	2 jours	52
52	Remise en état de la plage de dépôt et possible travaux de curage	3 jours	47
53	Remise en état	2 jours	52
54	Marge sur délais	6 jours	5FF
