DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise:	**FORADOUR**
Client:	**STELLANTIS** Usine de Caen 14120 MONDEVILLE
Maître d'oeuvre:	**GEOTHERMAQ** Technopole HELIOPARC 64000 PAU
Exploitant:	3 Z.A. de Laouranne 40250 MUGRON

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :

Coordonnées : **Longitude** 0 **Latitude** 0 ***Altitude :*** 0.00 m

Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage :	03/04/2024	***Resp. M. Ouvrage :***	
Date fin de l'ouvrage :	20/06/2024	***Resp. M. Oeuvre :***	
Machine :		***Resp. Chantier :***	

Date début pompage :		***Niveau statique non perturbé :***	19.50 m
Date fin de pompage :		***Débit Maxi. d'essai :***	0.00 m3/h
Nombre de nappes identifiées :		***Rabattement correspondant :***	0.00 m

Notes :

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client:	**STELLANTIS**
Maître d'oeuvre:	**GEOTHERMAQ**
Lieu de l'ouvrage :	

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre végétale
1.00	4.00	Calcaires marneux blanc
4.00	10.00	Calcaires récifaux à passées marneuses
10.00	20.00	Calcaires blanc spathique
20.00	27.00	Marnes tendre à débris fossiles
27.00	38.00	Calcaires gris graveleux à oolithes et fossiles
38.00	44.00	Calcaires grenus à silex
44.00	46.00	Marnes grises
46.00	56.00	Calcaires marneux gris à nombreuses passées marneuses
56.00	65.00	Marnes grises

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	24.00	24"	610.00	Rotary	Boue
24.00	60.00	17"	432.00	Rotary	Boue

** Reconnaissance*

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	24.00	20"	508.00	8.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
20.00	32.00	10"3/4	273.00	0.00		Inox-aisi-304	Tube-plein		
32.00	44.00	10"3/4	273.00	0.00		Inox-aisi-304	Crepine fil-enroule	3.00	
44.00	49.00	10"3/4	273.00	0.00		Inox-aisi-304	Tube-plein		
49.00	56.00	10"3/4	273.00	0.00		Inox-aisi-304	Crepine fil-enroule	3.00	
56.00	60.00	10"3/4	273.00	0.00		Inox-aisi-304	Tube-decanteur		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	24.00	20"	508.00	Ciment	Cpa 55	Sous pression			
20.00	60.00	10"3/4	273.00	Gravier	Graviers de silacq	Gravitaire	Roule	4.00-8.00	

FORAGE D'EAU

Client : STELLANTIS

Maitre d'oeuvre : GEOTHERMAQ

Localisation de l'ouvrage :


Travaux réalisés : 1\1
du : 03/04/2024 au : 20/06/2024

Coordonnées de l'ouvrage :
Lambert 1 carto métrique
Longitude (X): 0
Latitude (Y): 0
Altitude sol (Z): +0,000 m

Echelle : 1/327

Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus)

Nombre de forages : 1

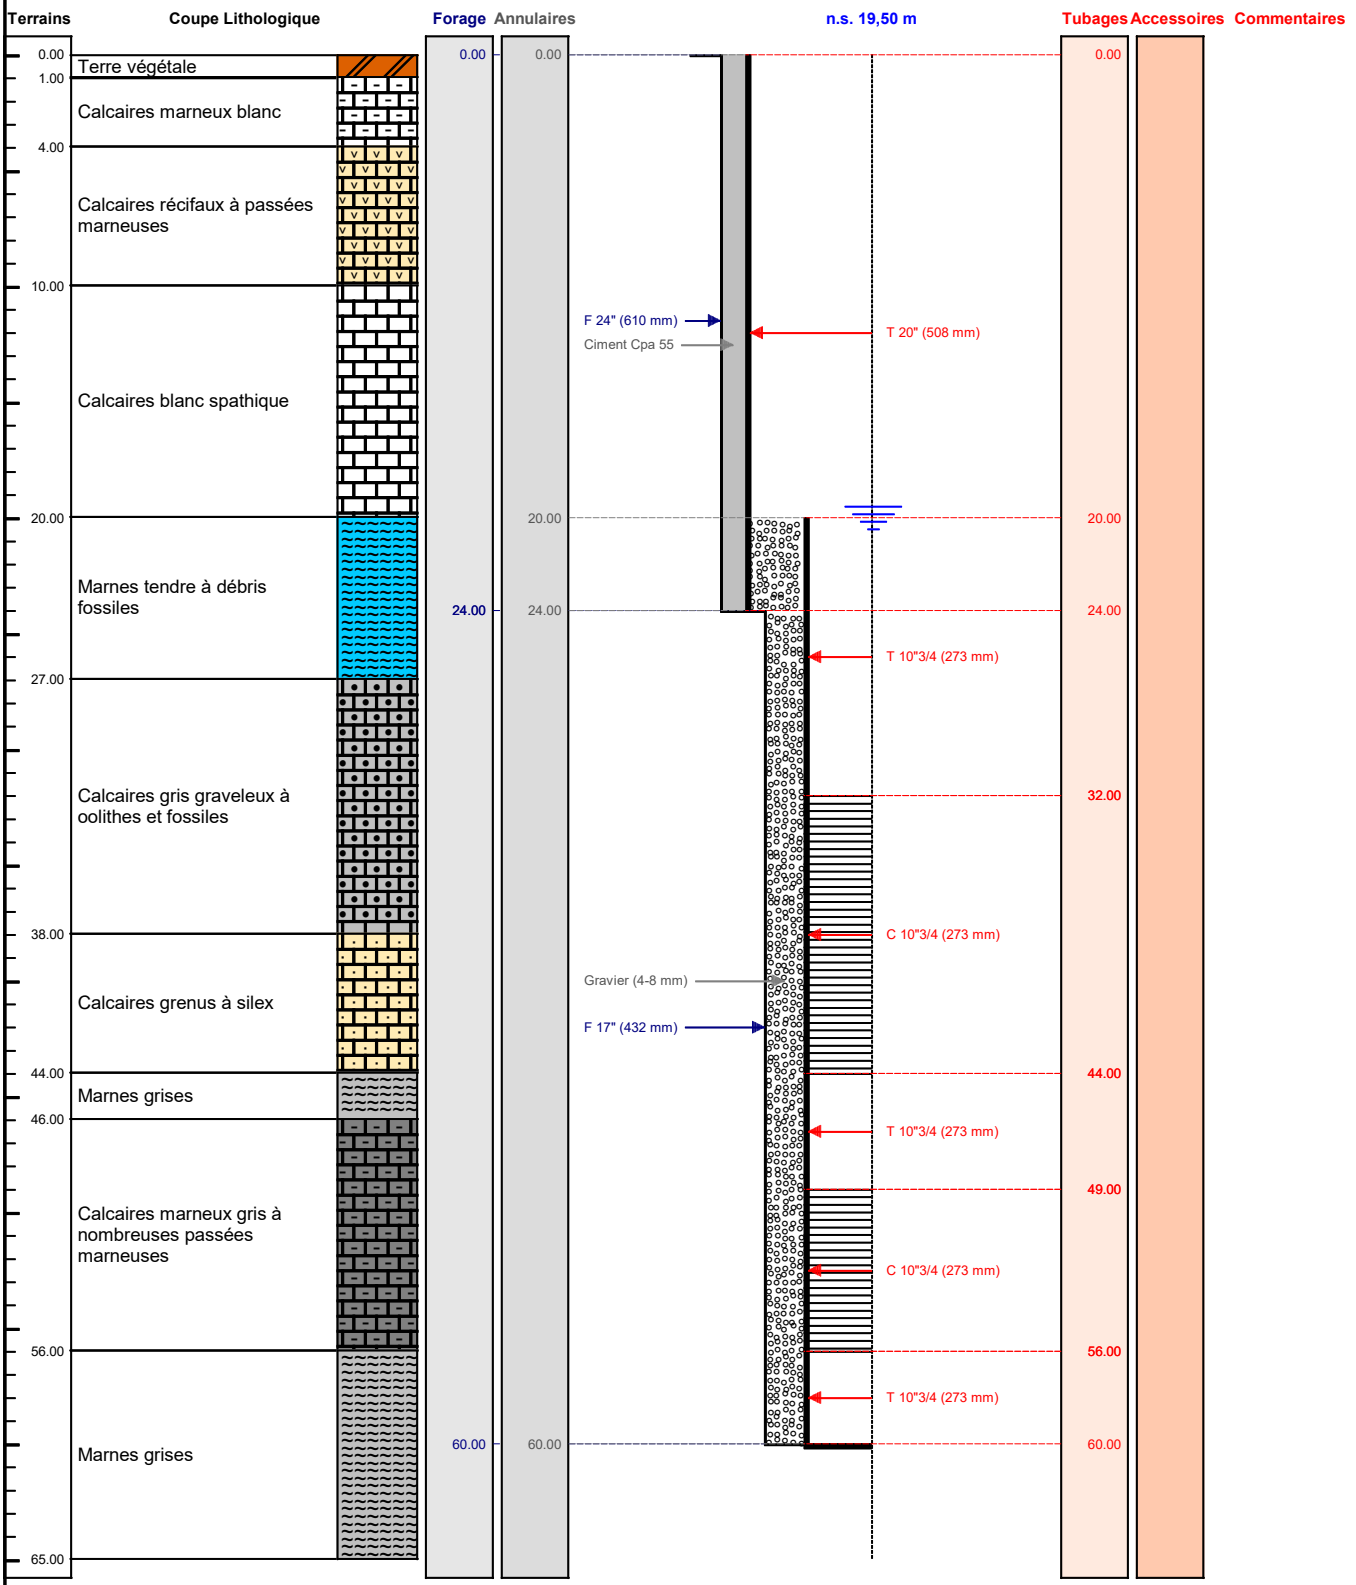

Le 31/01/2025 à Martignas

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise

FORADOUR
S.A.S au capital de 228 750 €
3 Z.A. Lauranne
40250 MUGRON
Tél.05 58 97 99 00 - Fax 05 58 97 70 77
RC Dax 343 658 779 - Siret 343 658 779 00032
